



CONTRATISTA : NECA S.R.L.

OBRA: "READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI"

UBICACION: SALTA CAPITAL

DEPARTAMENTO: CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNID.	% DE INCID.	DIAS		
				30	60	90
READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI -CERCADO PERIMETRAL, CAMINERIA INTERNA, CANCHAS MULTIFUNCION - ESTACIONAMIENTO E INST. ELECTRICA EN GRAL MICROESTADIO DELMI						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Demoliciones y retiro de escombros	m2	2.57%	100.00%	2.57%	
2	ALBAÑALERIA baños publicos					
2.01	Revoque bajo revestimiento	m2	2.13%	10.00%	0.21%	70.00%
2.02	Revestimiento blanco	m2	4.53%	10.00%	0.45%	70.00%
3	ALBAÑALERIA vestuarios					
3.01	Revoque bajo revestimiento	m2	0.75%	40.00%	0.30%	40.00%
3.02	Revestimiento blanco	m2	1.59%	40.00%	0.64%	40.00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS baños publicos					
4.01	cañería principal e interna	gl	3.59%	90.00%	3.23%	10.00%
4.02	griferias y sanitarios	gl	4.15%	90.00%	3.74%	10.00%
5	INSTALACIONES SANITARIAS vestuarios					
5.01	cañería principal e interna	gl	2.88%	90.00%	2.59%	10.00%
5.02	duchas y artefactos	gl	4.26%	90.00%	3.83%	10.00%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS baños publicos					
6.01	cañerías y cableado	gl	8.68%			80.00%
6.02	provision e instalacion de artefactos nuevos	gl	5.78%			20.00%
6.03	instalacion de artefactos provisto por administracion en altura	gl	0.90%			50.00%
6.04	Automatizacion bomba	gl	2.54%	30.00%	0.76%	60.00%
7	ABERTURAS baños publicos					
7.01	P1 (0.7x1.60)	Unid	1.87%			90.00%
7.02	P2 (1.00x1.60)	Unid	0.52%			90.00%
7.03	P3 (1.80x1.10)	Unid	1.35%			90.00%
8	PINTURA baños publicos					
8.01	Latex interior	m2	0.78%			10.00%
9	PINTURA vestuarios					
9.01	Latex interior	m2	2.27%			10.00%
10	MESADAS baños publicos					
10.01	granito gris mara incluido bacha	gl	1.94%			100.00%
11	ESPEJOS Y ACCESORIOS baños publicos					
11.01	espejos 4 mm	m2	0.17%			100.00%
ESTADIO DELMI						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Demoliciones y retiro de escombros	m2	1.74%	100.00%	1.74%	
2	ALBAÑALERIA baños administracion					
2.01	Revoque bajo revestimiento	m2	0.46%	20.00%	0.09%	80.00%
2.02	Revestimiento blanco	m2	0.98%	20.00%	0.20%	80.00%
3	ALBAÑALERIA vestuarios arbrito y asador					
3.01	Revoque bajo revestimiento	m2	1.01%	20.00%	0.20%	80.00%
3.02	Revestimiento blanco	m2	2.15%	20.00%	0.43%	80.00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS baños administracion					
4.01	cañería principal e interna	gl	1.45%	80.00%	3.72%	20.00%



NECA S.R.L.  
 Ing. OMAR ANGEL CARRAL  
 Socio Gerente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 PROLINA SURANA RUSSO  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

FOLIO 70

4.01	cañería principal e interna	gr	4.00%					
4.02	griferías sanitarios y termotanques	gl	3.33%	80.00%	2.66%	20.00%	0.67%	
<b>5 INSTALACIONES ELECTRICAS UPS</b>								
5.01	cañería y cableado	gl	1.96%			60.00%	1.17%	40.00% 0.78%
5.02	llaves y tomas	gl	0.80%			60.00%	0.48%	40.00% 0.32%
<b>6 INSTALACIONES ELECTRICAS baños administracion</b>								
6.01	cañerías y cableado	gl	0.96%			70.00%	0.67%	30.00% 0.29%
6.02	llaves y tomas	gl	0.63%			70.00%	0.44%	30.00% 0.19%
<b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS PISTA DE SKATE</b>								
7.01	cañerías y cableado	gl	11.79%			40.00%	4.72%	60.00% 7.07%
7.02	artefactos	gl	4.41%			40.00%	1.77%	60.00% 2.65%
<b>8 ABERTURAS baños administracion</b>								
8.01	P2 (1.00x1.60)	Unid	1.30%					100.00% 1.30%
<b>9 PINTURA baños administracion</b>								
9.01	Latex interior	m2	0.61%			30.00%	0.18%	70.00% 0.43%
<b>10 PINTURA vestuarios</b>								
10.01	Latex interior	m2	3.36%			30.00%	1.01%	70.00% 2.35%
<b>11 PINTURA administracion</b>								
11.01	latex sintético	m2	2.41%			30.00%	0.72%	70.00% 1.69%
<b>12 ARREGLO TECHO</b>								
12.01	Membrana aluminizada 4 mm	m2	3.36%	75.00%	2.52%	25.00%	0.84%	
<b>13 MESADAS baños administracion</b>								
13.01	granito gris mara	m2	0.75%					100.00% 0.75%
<b>14 ESPEJOS Y ACCESORIOS baños administracion</b>								
14.01	espejos 4 mm	m2	0.09%					100.00% 0.09%
<b>AVANCE FISICO</b>		<b>MENSUAL</b>			29.89%		38.10%	32.00%
		<b>ACUMULADO</b>			29.89%		68.00%	100.00%
<b>INVERSION</b>		<b>MENSUAL</b>			\$ 2,484,540.24		\$ 3,166,927.37	\$ 2,659,854.26
		<b>ACUMULADO</b>			\$ 2,484,540.24		\$ 5,651,467.61	\$ 8,311,321.87

Neca S.R.L.  
ing. OMAR ANGEL CARRAI  
Socio Gerente




**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

CAROLINA SUAREZ RUSSO  
SECRETARIA DE ASUNTOS PÚBLICOS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA





OBRA : READECUACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ESTADIO DELMI  
CURVA DE INVERSION

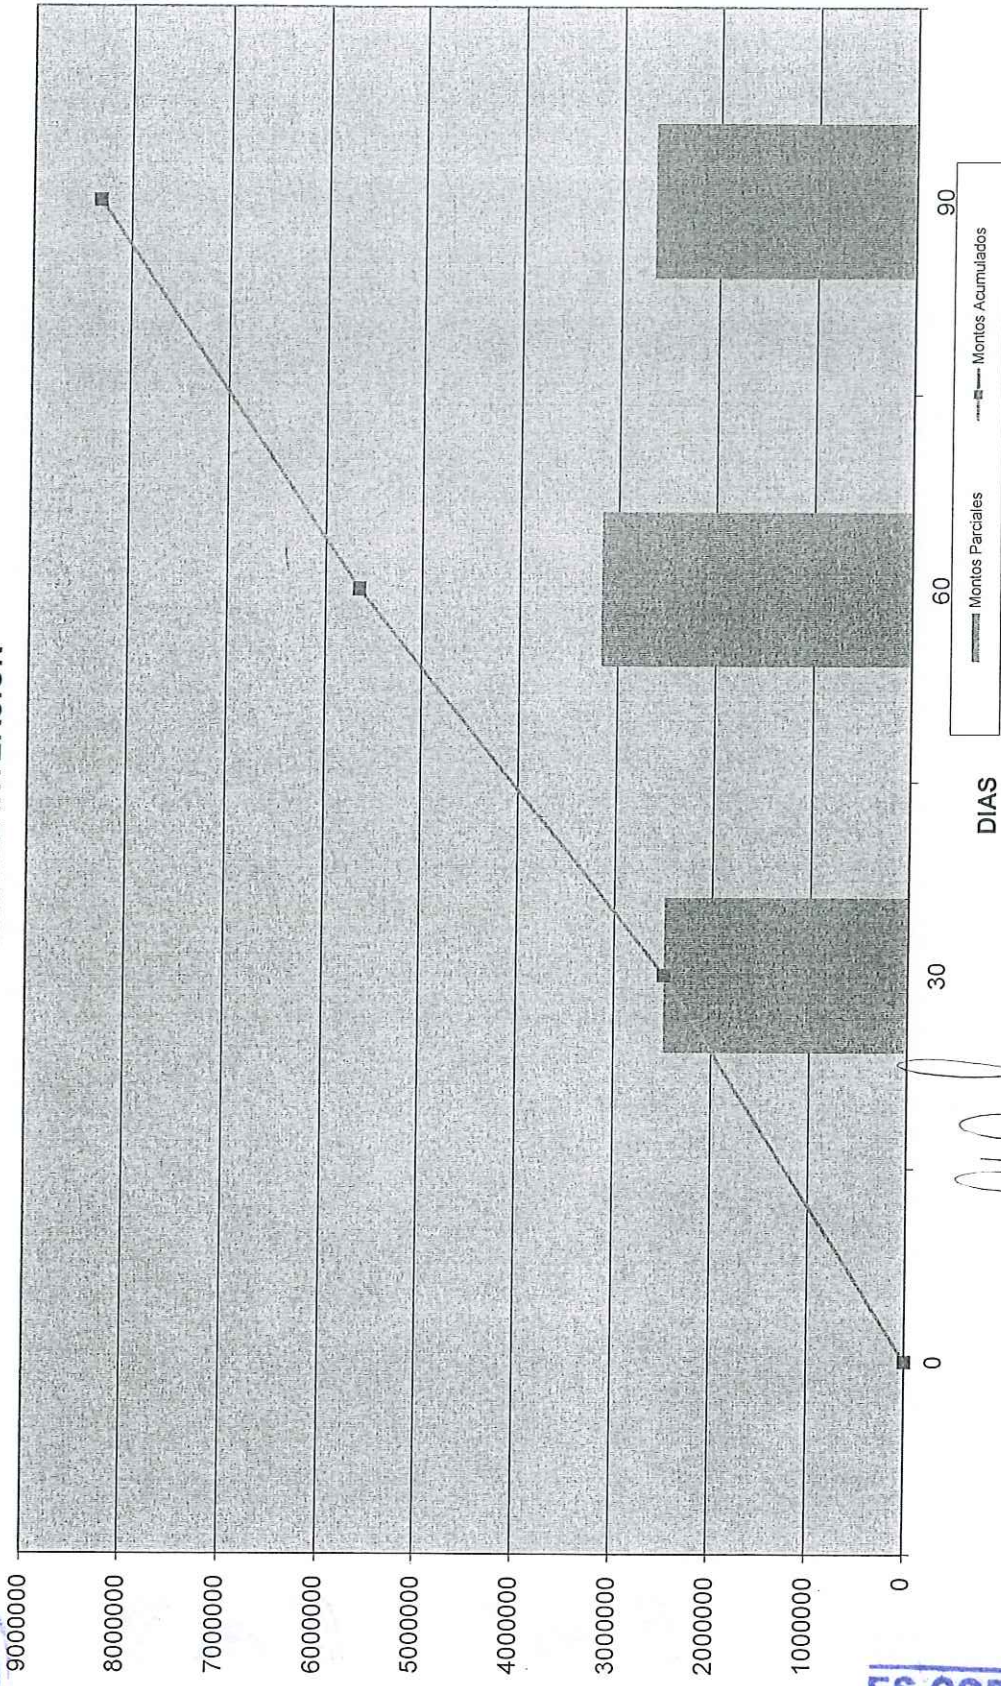

MONTO

DIAS

Montos Parciales  
Montos Acumulados



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

*[Handwritten signature]*  
Neca S.R.L.  
Ing. OMAR ANGEL CARRA  
Socio Gerente
