



WALTER L. CHAMBE
COORDINACION DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



OBRA: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE ANGASTACO – 2da ETAPA - DPTO. S.
CARLOS – PROVINCIA DE SALTA
PLAZO DE OBRA: 90 DIAS
OFERENTE: CYL SRL
ADICIONALES DE OBRA

PLAN DE TRABAJOS

| Nº | RUBROS Designación | MONTO | Incidencia % | PLAZO DE OBRA | | |
|----------|---|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 1º mes | 2º mes | 3º mes |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | \$ 295.006,82 | 8,984% | 4,492% | 4,492% | |
| A | SECTOR SERVICIOS + DIAGNOSTICO | | | | | |
| 2 | REVOQUES | \$ 114.495,64 | 3,487% | | | |
| 3 | PINTURA | \$ 68.733,65 | 2,093% | | 3,487% | |
| B | CONSULTA EXTERNA + APS + GALERIA | | | | | 2,093% |
| 4 A 10 | ESTRUCTURA | \$ 614.381,30 | 18,711% | 9,356% | 9,356% | |
| 11 | MAMPOSTERIA | \$ 47.520,18 | 1,447% | | 1,447% | |
| 12 A 13 | AISLACIONES | \$ 185.274,62 | 5,643% | | 5,643% | |
| 14 | REVOQUES | \$ 33.042,37 | 1,006% | | | 1,006% |
| 15 | CONTRAPISOS | \$ 162.618,81 | 4,953% | | 2,476% | 2,476% |
| 16 A 18 | PISOS | \$ 413.725,93 | 12,600% | | 6,300% | 6,300% |
| 19 A 20 | CUBIERTA | \$ 327.735,92 | 9,981% | | | 9,981% |
| 21 | CARPINTERIAS Y MODULOS BAJO MESADAS | \$ 522.819,27 | 15,923% | | 7,961% | 7,961% |
| 22 | PINTURA | \$ 19.835,89 | 0,604% | | | 0,604% |
| C | INSTALACIONES | | | | | |
| 23 | INSTALACION SANITARIA | \$ 478.320,23 | 14,567% | | 7,284% | 7,284% |
| | | Subtotal | 100,00% | | | |
| | | \$ 3.283.510,63 | | | | |
| | | % de Avance Mensual Previsto | | 13,848% | 48,446% | 37,706% |
| | | % de Avance Acumulado Previsto | | 13,848% | 62,294% | 100,000% |
| | | Monto de Inversión Mensual Previsto | | \$ 454.694,06 | \$ 1.590.726,62 | \$ 1.238.089,54 |
| | | Monto de Inversión Acumulado Previsto | | \$ 454.694,06 | \$ 2.045.420,68 | \$ 3.283.510,63 |
| | | Monto de Inversión Acumulado Previsto con coef. Resumen | | \$ 686.543,07 | \$ 3.088.382,98 | \$ 4.957.776,38 |

SERGIO E. CARABAJAL
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131


SERGIO E. CARABAJAL
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131

ES COPIA FIEL

WALTER L. CHAMBE
COORDINACION DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



CURVA DE INVERSIONES

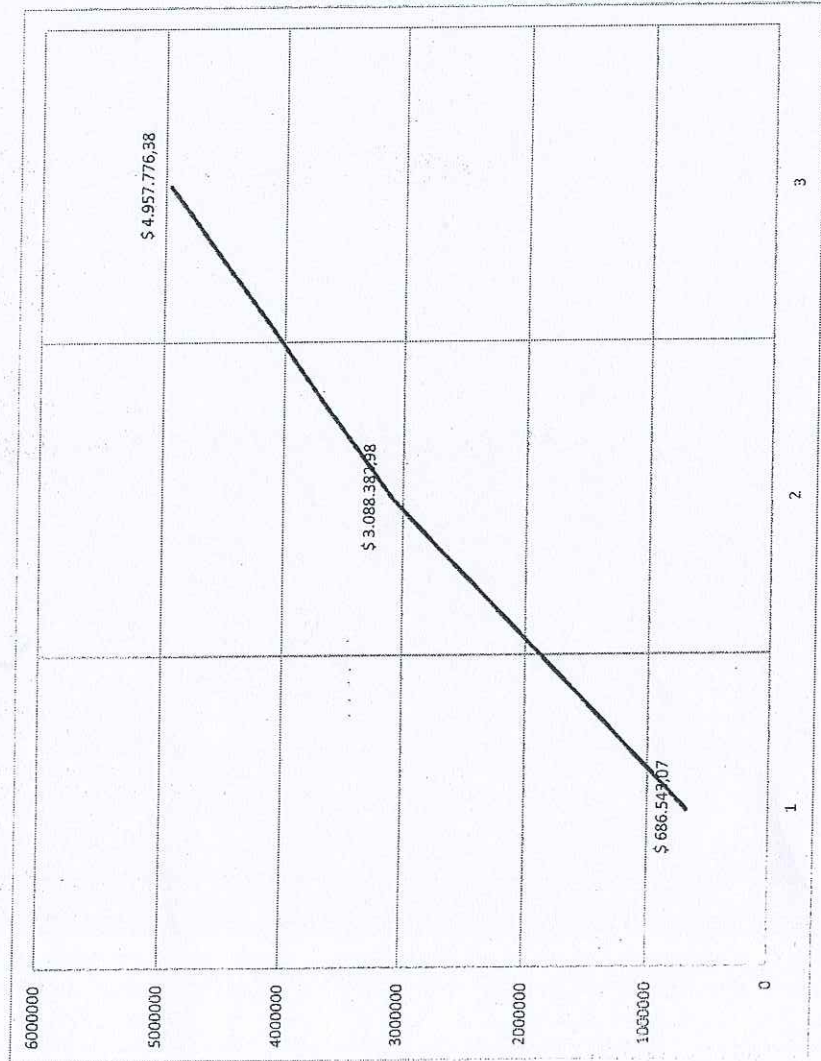

BERNIO E. CAPAZAJA
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131

BERNIO E. CAPAZAJA
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. 4131
