

ANEXO 6 CRONOGRAMA DE TRABAJOS

	TRABAJOS A REALIZAR	%		1° PERIODO		2° PERIODO
1,1	Proyecto Ejecutivo	4,37%	4,37%	100		
2,5	De sobre carga	0,66%	0,66%	100		
2,6	De frontis en fachada	0,88%	0,88%	100		
2,7	Retiro de Base Tanque de Reserva	0,11%	0,11%	100		
2,8	De Piso y contrapiso	2,94%	2,94%	100		
2,9	De pared	1,53%	1,53%	100		
14,1	Excavación a mano	0,33%	0,33%	100		
14,2	Excavación de zanja p/desague	0,57%	0,57%	100		
15,1	H° de Limpieza	0,29%	0,29%	100		
15,2	Bases H° A°	6,42%	3,21%	50	3,21%	50
15,3	Viga de fund. H° A°	4,66%	4,66%	100		
15,4	Est. H°A° Columnas resistentes	5,29%	5,29%	100		
15,5	Est. H°A° Vigas resistentes	5,19%	5,19%	100		
15,6	Losa H°A°(T.R.)	1,55%			1,55%	100
15,7	Refuerzo en Muro frontal	9,66%			9,66%	100
16,1	Capa Aisladora horizontal	0,23%	0,23%	100		
17,1	Pared de ladrillo macizo	5,66%	5,66%	100		
17,2	Pared ladrillo hueco 18x18x30	11,92%	11,92%	100		
17,3	Pared de ladrillo hueco x 8 cm de ancho	0,78%			0,78%	100
18,1	Contrapiso Fratazado e:10cm	5,62%	5,62%	100		
5,1	Exterior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	4,59%			4,59%	100
5,2	Interior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	2,93%			2,93%	100
8,3	Provisión y colocación de puerta	1,01%			1,01%	100
8,4	Provisión y colocación de ventana en Consultorio	0,87%			0,87%	100
19,1	Carpeta y alisado	3,91%			3,91%	100
9,1	pintura al látex interior	1,81%			1,81%	100
9,2	pintura al látex exterior	3,02%			3,02%	100
10,3	instalación eléctrica en deposito	0,61%			0,61%	100
11,3	Reubicación de tanque de reserva	0,55%			0,55%	100
11,4	Provisión de agua al sector de Dormitorios	1,89%			1,89%	100
11,5	Construcción de Desague pluvial	7,97%	3,98%	50	3,98%	50
13,1	Limpieza final de obra	2,19%	1,10%	50	1,10%	50
	parcial	100,00%		58,53%		41,47%
	mensual			\$1.157.273,79		\$819.982,14
	acumulado			\$ 1.157.273,791		\$ 1.977.255,934

0,00%

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINALCAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


100,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Arq. MUR MANUEL
Mot. 976

REPRESENTANTE LEGAL
Arq. MANUEL MUR
Año 1976

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: "ADICIONAL REFACCION INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PROGRAMA
PROPONENTE: MANUEL MUR

CURVA DE INVERSIÓN

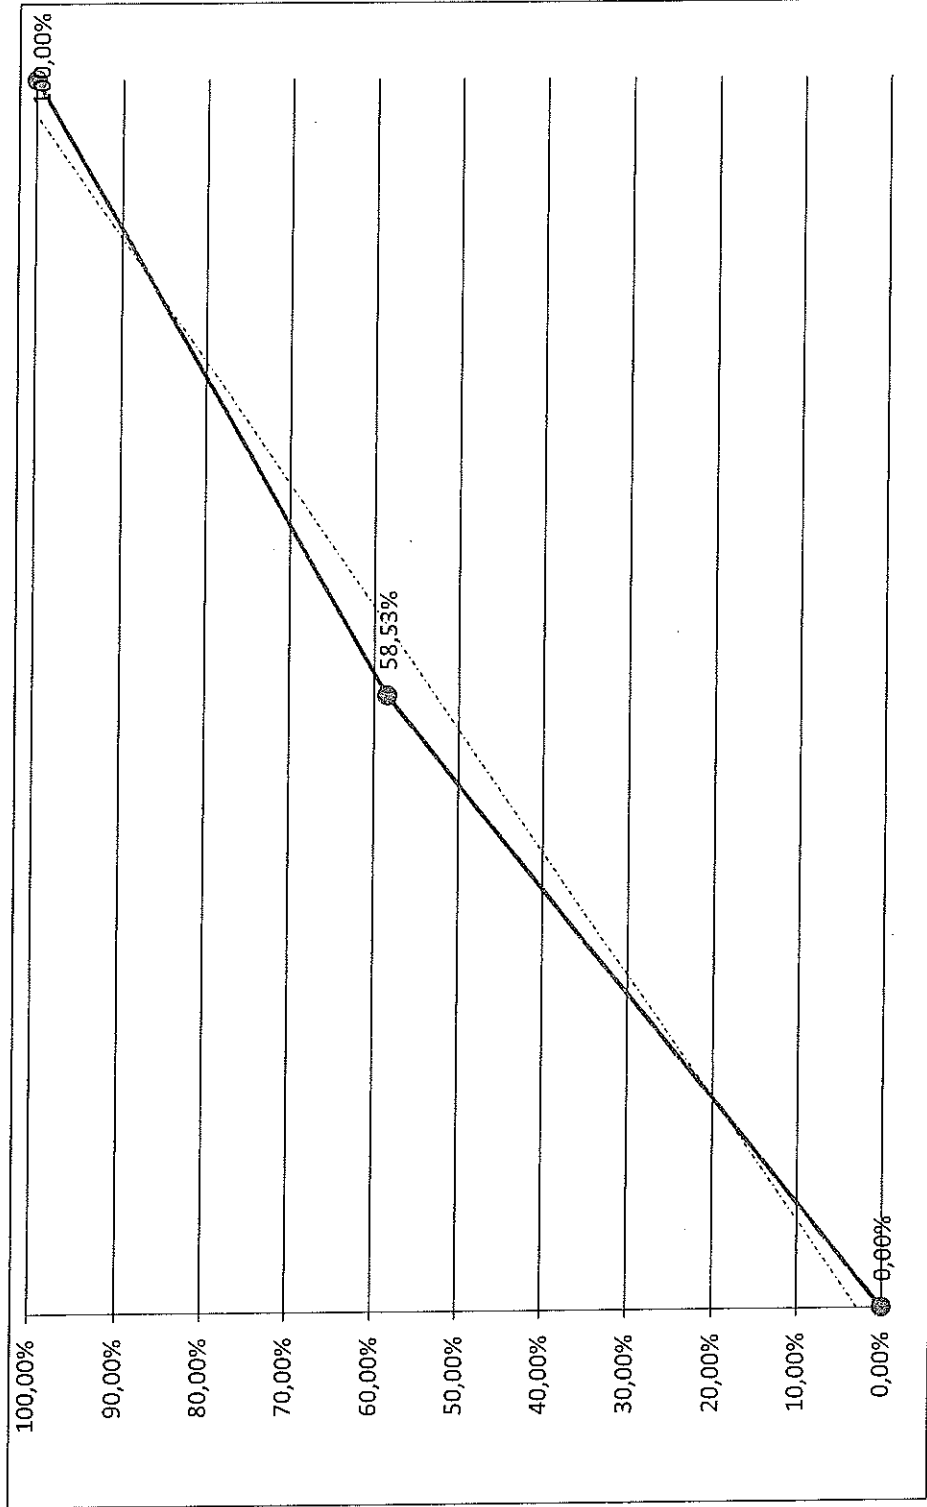

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
CAROLINA SUSANA RUSSE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
